

垣曲县逸景幼儿园建设项目
政府专项债券资金绩效评价报告

实施单位：垣曲县逸景幼儿园

主管单位：垣曲县教育局

委托单位：垣曲县财政局

评价机构：山西广和会计师事务所有限公司

2023年6月

目 录

目 录	2
一、基本情况	1
(二) 项目内容及建设运营情况	2
(三) 项目资金概况	2
根据合同约定, 债券金额为 1,000.00 万元, 年利率 3.24%, 自 2022 年 6 月 28 日起计息, 付息时间为每年的 6 月 28 日和 12 月 28 日, 第 11、12、13、14、15 年各按 20% 偿还本金和利息。截至绩效评价日, 应偿还债券利息共 1 期, 为第一期 2022 年 12 月 28 日应付利息 16.2 万元, 经调查, 该项利息已足额支付。	4
(四) 专项收入归集使用情况	4
二、综合评价情况及评价结论	4
三、主要经验做法	5
该项目建成运营后, 达到一级 A 类标准。可容纳 18 个教学班, 解决 540 余名幼儿入园就读问题, 确保幼儿享受到优质的学前教育。项目的建成运营解决了儿童的学前教育问题, 是周边群众盼望已久的需要, 是促进幼儿教育事业持续发展的一大举措, 极大改善垣曲县县城南部幼儿入学难的问题。	5
四、存在的问题及原因分析	6
(一) 未办理施工许可证	6
(二) 资产管理不到位	6
(三) 问题整改不到位	6
五、改进建议及措施	6
(一) 完善建设手续, 强化资产管理	6
(二) 净化室内环境	6
经现场查看垣曲县逸景幼儿园教室环境, 部分教室家具气味较重, 建议进行室内环境检测, 或布置绿植净化空气。	6
一、基本情况	7
(一) 项目概况	7
(二) 项目内容及建设运营情况	8
(三) 项目资金概况	9
根据合同约定, 债券金额为 1,000.00 万元, 年利率 3.24%, 15 年期, 自 2022 年 6 月 28 日起计息, 付息时间为每年的 6 月 28 日和 12 月 28 日, 第 11、12、13、14、15 年各按 20% 偿还本金和利息。截至绩效评价日, 应偿还债券利息共 1 期, 为第一期 2022 年 12 月 28 日应付利息 16.2 万元, 经调查, 该项利息已足额支付。	10
(四) 项目形成资产及管理情况	10
2. 资产管理情况	11
垣曲县逸景幼儿园建设项目在投入使用后, 房屋建筑物未及时转入固定资产进行管理, 也未办理房产登记手续。	11
(五) 专项收入归集使用情况	11
(六) 项目绩效目标	11
二、绩效评价工作开展情况	12
(一) 绩效评价目的和依据	12
(二) 绩效评价对象和范围	13
(三) 绩效评价基准日	13

(四) 绩效评价原则.....	13
(五) 绩效评价指标体系.....	14
(六) 绩效评价方法.....	16
(七) 绩效评价标准.....	16
(八) 绩效评价工作过程.....	16
三、综合评价情况及评价结论.....	18
(一) 综合评价情况.....	18
(二) 评价结论.....	18
四、绩效评价指标分析.....	19
(一) 项目决策情况.....	19
(二) 项目管理情况.....	22
(三) 项目产出情况.....	27
经查看垣曲县逸景幼儿园各项考核结果,安全运营能够达到标准,未发现相关行政问责或经济处罚。依据评分标准,安全运营达到行业标准,且未受到相关行政问责或经济处罚,得2分。此处得分2分。.....	30
经调查访谈,垣曲县逸景幼儿园在运营期未接到群众投诉,未出现媒体重大负面舆情报道,未出现对自然生态环境可能造成的负面影响。依据评分标准,此处得分2分。..	30
(四) 项目效益情况.....	31
五、主要经验及做法.....	33
六、存在的问题及原因分析.....	34
(一) 未办理施工许可证.....	34
(二) 资产管理不到位.....	34
(三) 问题整改不到位.....	34
七、改进建议及措施.....	34
(一) 完善建设手续,强化资产管理.....	34
(二) 净化室内环境.....	34
经现场查看垣曲县逸景幼儿园教室环境,部分教室家具气味较重,建议进行室内环境检测,或布置绿植净化空气。.....	34
八、绩效评价结果应用建议.....	35
附件 1: 绩效评价指标体系.....	36
附件 2: 绩效评价指标评分表.....	44
附件 3: 反映绩效的照片.....	45
附件 4: 调查问卷分析报告.....	46

垣曲县逸景幼儿园建设项目 政府专项债券资金绩效评价报告摘要

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。改革开放特别是新世纪以来，垣曲县学前教育取得长足发展，普及程度逐步提高。但总体上看，学前教育仍是各级各类教育中的薄弱环节，主要表现为教育资源短缺、投入不足，师资队伍不健全，体制机制不完善，城乡区域发展不平衡，一些地方“入园难”问题突出。

根据《山西省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（晋发〔2011〕15号）及《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》教基〔2017〕3号的精神，为满足学前教育适龄儿童的需求，实现垣曲县幼儿教育事业的科学、均衡、公平发展，垣曲县教科局新建逸景幼儿园建设项目。

2. 立项依据

（1）《国务院办公厅关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》（国办发〔2019〕3号）

（2）《山西省人民政府办公厅关于全省开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》（晋政办发〔2019〕21号）

（3）《垣曲县人民政府常务会议纪要》（〔2020〕第1次）

（4）《关于呈请审批垣曲县逸景幼儿园建设项目初步设计的请示》（垣教函字〔2020〕91号）

(5) 《关于垣曲县逸景幼儿园建设项目初步设计的批复》（垣审管函〔2020〕197号）

(6) 《关于垣曲县逸景幼儿园建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（垣审管函〔2020〕67号）

（二）项目内容及建设运营情况

1. 项目内容

垣曲县逸景幼儿园建设项目占地面积 6556.19 m²（9.83 亩），总建筑面积 6550 m²，主体建筑为 1 栋三层的框架式教学楼，主要包括 18 个标准的一体化幼儿园活动室、各类功能用房、办公用房、餐厅厨房、多功能厅及室外管网、配套附属设施及设备购置；共设 6 轨 18 个教学班，可容纳 540 名学前适龄儿童就读。

2. 项目建设运营情况

垣曲县逸景幼儿园为垣曲县教育科技局下属公益二类股级事业单位，该建设项目由垣曲县逸景幼儿园负责建设运营，经公开招标，项目由山西舜达建筑工程有限公司负责主体建设，山西天亚建筑工程有限公司负责装饰工程。该项目于 2022 年 8 月 24 日竣工验收，于 2023 年 3 月 1 日开学招生。截至 2023 年 5 月，共有在校幼儿 69 名。

（三）项目资金概况

1. 项目资金来源

垣曲县逸景幼儿园建设项目总投资 2,691.27 万元，其中政府专项债券资金 1,000.00 万元，县级配套资金 1,691.27 万元。该项目 2023 年投入运营后，幼儿收费 11.56 万元全部缴入县财政，运营成本 54.91 万元全部为县级财政资金。

2. 资金投入情况

截至绩效评价日，垣曲县逸景幼儿园建设项目累计投入建设资金 2,203.58 万元，其中：投入政府专项债券资金 1,000.00 万元，县级配套资金 1,203.58 万元；运营后投入运营资金 319,034.79 元。

3. 资金使用情况

截至绩效评价日，项目累计支出 2,203.58 万元，包括：前期费用、工程费用、装饰费用、设备采购等。具体支出情况见下表：

项目支出情况表

单位：元

项目	合同金额	已支付金额
地质灾害评估费用	42,000.00	42,000.00
咨询服务费	34,000.00	34,000.00
耕地开垦费	43,062.00	43,062.00
人防易地建设费	98,250.00	98,250.00
测图费	26,000.00	26,000.00
勘察费	29,000.00	29,000.00
工程预算费	24,790.00	24,790.00
岩土勘察费	16,000.00	16,000.00
静载试验	31,500.00	31,500.00
钻井费	6,000.00	6,000.00
土壤监测费	52,000.00	52,000.00
沉降观测费	33,820.00	0.00
建设工程费	16,527,600.00	15,701,220.00
监理费	214,800.00	193,320.00
设计费	295,000.00	202,898.00
装饰工程	1,968,000.00	1,771,200.00
监理费	23,600.00	0.00
内部设备采购项目	1,058,900.00	953,010.00
智慧校园采购项目	1,212,165.00	1,212,165.00
照明及电器设备采购项目	241,718.00	193,374.40
中央空调系统、净水系统项目	1,419,501.57	1,135,601.00
外墙铝板、钢结构雨棚工程	3,067,000.00	0.00
设计费	76,770.00	0.00
10KV 配电工程	270,432.00	270,432.00
财务评估服务费	49,800.00	0.00
法律意见服务费	47,000.00	0.00
绩效评估费	4,000.00	0.00
合计	26,912,708.57	22,035,822.40

4. 专项债券还本付息情况

根据合同约定，债券金额为 1,000.00 万元，年利率 3.24%，自 2022 年 6 月 28 日起计息，付息时间为每年的 6 月 28 日和 12 月 28 日，第 11、12、13、14、15 年各按 20% 偿还本金和利息。截至绩效评价日，应偿还债券利息共 1 期，为第一期 2022 年 12 月 28 日应付利息 16.2 万元，经调查，该项利息已足额支付。

（四）专项收入归集使用情况

垣曲县逸景幼儿园为一级 A 类园，收入主要为保教费收入和补贴收入，保教费为 245 元/月/人，补助收入为 900 元/年/人，每学期为 5 个月，每名学生 1675 元/学期。该项目的收费模式为学生家长直接缴费至国库，由垣曲县财政局统一管理，2023 年运营后，共招生 69 名，收入为 115,575.00 元，其中：保教费收入 84,525.00 元，补贴收入 31,050.00 元。

二、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

绩效评价项目组通过实施数据采集、现场核查、问卷调查、重点访谈、汇总分析等程序，依据相关文件和经审定的绩效评价指标体系及评分标准，对垣曲县逸景幼儿园建设项目政府专项债券资金进行客观评价，最终评分结果总得分 93.50 分，评分等级为“优”，各指标得分情况见附件 1。各项指标分值及得分情况见下表：

绩效评价得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20.00	40.00	30.00	10.00	100.00
得分	19.50	35.00	30.00	9.00	93.50
得分率	97.50%	87.50%	100.00%	90.00%	93.50%

（二）评价结论

经过对垣曲县逸景幼儿园建设项目决策、管理、产出和效益综合评价，得出以下结论：

1. 项目决策。决策过程方面，该项目立项依据充分，符合国家相关法律法规；项目公共特点明显，符合地方政府债券资金申请标准；绩效目标方面，绩效目标依据充分，能够细化、可衡量；债券安排方面，项目申请债券资金额度能够满足项目建设实际需求。

2. 项目管理。资金管理方面，债券资金收支能够纳入政府性基金管理，使用用途符合规定，能够及时付息，具备按时偿债能力。在资产管理方面，房屋建筑物未能及时转为固定资产管理，未办理产权登记手续。在组织管理方面，项目运行管理机制较为健全，执行有效，信息公开规范及时。

3. 项目产出。项目能够按计划开始运营招生，产出质量经考核后能够达到目标，运营成本支出合理，运营期未发生安全事故。

4. 项目效益。该项目在经济效益方面未能 100%完成经济效益目标，在社会效益方面，通过幼儿园运营，解决了垣曲县南部幼儿入学难问题，推动了垣曲县学前教育的发展，受益群众满意度较高。

三、主要经验做法

垣曲县逸景幼儿园是一所隶属于教育局管辖的小区配套优质公办幼儿园，旨在解决逸景花城小区及周边小区幼儿入园难问题，是垣曲县委县政府 2020 年重点建设项目。该项目在建设期能够严格执行采购程序，均进行了公开招标采购。

该项目建成运营后，达到一级 A 类标准。可容纳 18 个教学班，解决 540 余名幼儿入园就读问题，确保幼儿享受到优质的学前教育。

项目的建成运营解决了儿童的学前教育问题，是周边群众盼望已久的需要，是促进幼儿教育事业持续发展的一大举措，极大改善垣曲县城南部幼儿入学难的问题。

四、存在的问题及原因分析

（一）未办理施工许可证

经查看垣曲县逸景幼儿园相关建设报建资料，发现该项目未取得施工许可证，建设程序不规范。

（二）资产管理不到位

经查看垣曲县逸景幼儿园账务资料，发现建设工程投入使用后未及时转入固定资产管理，也未办理房产登记手续。

（三）问题整改不到位

经查看垣曲县逸景幼儿园外部检查资料，发现建设项目的消防工程被提出整改意见，截至绩效评价日，未能及时整改。

五、改进建议及措施

（一）完善建设手续，强化资产管理

建议垣曲县逸景幼儿园补充完善施工手续，及时将在建工程转为固定资产，尽快办理房产登记手续；尽快整改消防工程问题。

（二）净化室内环境

经现场查看垣曲县逸景幼儿园教室环境，部分教室家具气味较重，建议进行室内环境检测，或布置绿植净化空气。

垣曲县逸景幼儿园建设项目 政府专项债券资金绩效评价报告

晋广和绩评（2023）0011号

垣曲县财政局：

为深入贯彻落实《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，落实山西省财政工作会议的部署要求，全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力。我单位接受贵局委托，对垣曲县逸景幼儿园建设项目政府专项债券资金开展绩效评价。本次绩效评价结果为93.50分，等级为“优”。有关情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。改革开放特别是新世纪以来，垣曲县学前教育取得长足发展，普及程度逐步提高。但总体上看，学前教育仍是各级各类教育中的薄弱环节，主要表现为教育资源短缺、投入不足，师资队伍不健全，体制机制不完善，城乡区域发展不平衡，一些地方“入园难”问题突出。

根据《山西省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）（晋发〔2011〕15号）》及《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》教基〔2017〕3号的精神，为满足学前教育适龄儿童的需求，实现垣曲县幼儿教育事业的科学、均衡、公平发展，垣曲县教科局新建逸景幼儿园建设项目。

2. 立项依据

(1) 《国务院办公厅关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》（国办发〔2019〕3号）

(2) 《山西省人民政府办公厅关于全省开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》（晋政办发电〔2019〕21号）

(3) 《垣曲县人民政府常务会议纪要》（〔2020〕第1次）

(4) 《关于呈请审批垣曲县逸景幼儿园建设项目初步设计的请示》（垣教函字〔2020〕91号）

(5) 《关于垣曲县逸景幼儿园建设项目初步设计的批复》（垣审管函〔2020〕197号）

(6) 《关于垣曲县逸景幼儿园建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（垣审管函〔2020〕67号）

(二) 项目内容及建设运营情况

1. 项目内容

垣曲县逸景幼儿园建设项目占地面积 6556.19 m²（9.83 亩），总建筑面积 6550 m²，主体建筑为 1 栋三层的框架式教学楼，主要包括 18 个标准的一体化幼儿园活动室、各类功能用房、办公用房、餐厅厨房、多功能厅及室外管网、配套附属设施及设备购置；共设 6 轨 18 个教学班，可容纳 540 名学前适龄儿童就读。

2. 项目建设运营情况

垣曲县逸景幼儿园为垣曲县教育科技局下属公益二类股级事业单位，该建设项目由垣曲县逸景幼儿园负责建设运营，经公开招标，项目由山西舜达建筑工程有限公司负责主体建设，山西天亚建筑工程有限公司负责装饰工程。该项目于 2022 年 8 月 24 日竣工验收，于

2023年3月1日开学招生。截至2023年5月，共有在校学生69人，其中：小一班25人，小二班28人，中一班16人。

（三）项目资金概况

1. 项目资金来源

垣曲县逸景幼儿园建设项目总投资2,691.27万元，其中政府专项债券资金1,000.00万元，县级配套资金1,691.27万元。该项目2023年投入运营后，幼儿收费11.56万元全部缴入县财政，运营成本54.91万元全部为县级财政资金。

2. 资金投入情况

截至绩效评价日，垣曲县逸景幼儿园建设项目累计投入建设资金2,203.58万元，其中：投入政府专项债券资金1,000.00万元，县级配套资金1,203.58万元；运营后投入运营资金319,034.79元。

3. 资金使用情况

截至绩效评价日，项目累计支出2,203.58万元，包括：前期费用、工程费用、装饰费用、设备采购等。具体支出情况见下表：

项目支出情况表

单位：元

项目	合同金额	已支付金额
地质灾害评估费用	42,000.00	42,000.00
咨询服务费	34,000.00	34,000.00
耕地开垦费	43,062.00	43,062.00
人防易地建设费	98,250.00	98,250.00
测图费	26,000.00	26,000.00
勘察费	29,000.00	29,000.00
工程预算费	24,790.00	24,790.00
岩土勘察费	16,000.00	16,000.00
静载试验	31,500.00	31,500.00
钻井费	6,000.00	6,000.00
土壤监测费	52,000.00	52,000.00
沉降观测费	33,820.00	0.00
建设工程费	16,527,600.00	15,701,220.00

项目	合同金额	已支付金额
监理费	214,800.00	193,320.00
设计费	295,000.00	202,898.00
装饰工程	1,968,000.00	1,771,200.00
监理费	23,600.00	0.00
内部设备采购项目	1,058,900.00	953,010.00
智慧校园采购项目	1,212,165.00	1,212,165.00
照明及电器设备采购项目	241,718.00	193,374.40
中央空调系统、净水系统项目	1,419,501.57	1,135,601.00
外墙铝板、钢结构雨棚工程	3,067,000.00	0.00
设计费	76,770.00	0.00
10KV 配电工程	270,432.00	270,432.00
财务评估服务费	49,800.00	0.00
法律意见服务费	47,000.00	0.00
绩效评估费	4,000.00	0.00
合计	26,912,708.57	22,035,822.40

4. 专项债券还本付息情况

根据合同约定，债券金额为 1,000.00 万元，年利率 3.24%，15 年期，自 2022 年 6 月 28 日起计息，付息时间为每年的 6 月 28 日和 12 月 28 日，第 11、12、13、14、15 年各按 20% 偿还本金和利息。截至绩效评价日，应偿还债券利息共 1 期，为第一期 2022 年 12 月 28 日应付利息 16.2 万元，经调查，该项利息已足额支付。

（四）项目形成资产及管理情况

1. 项目资产情况

垣曲县逸景幼儿园建设项目形成的资产类别包括房屋建筑物、土地使用权、电子设备、器具家具等，账面固定资产共 3761 项。

资产名称	数量	资产名称	数量
LED 显示屏	2 个	其他体育设备	8 个
变压器	1 个	其他娱乐设备	11 个
便携式计算机	1 个	清洁卫生电器	21 个
触控一体机	18 个	热水器	23 个
床类	550 张	沙发类	12 个
打印设备	8 个	视频监控设备	1 套
多功能一体机	2 个	室内照明灯具	252 个
架类	9 个	水池	3 项

资产名称	数量	资产名称	数量
键盘乐器	2 个	台、桌类	212 张
开关电器设备	36 个	台式机	30 台
空气调节电器	11 个	体操设备	3 套
烹调电器	10 个	文件柜	36 个
普通图书	1600 册	一般游乐场设备	2 套
其他办公设备	18 个	椅凳类	684 个
其他厨卫用具	21 个	音频功率放大器设备	1 套
其他柜	164 个	饮水机	1 套
其他乐器	1 个	制冷电器	2 套
其他生活用电器	4 个	专用制冷、空调设备	1 套

2. 资产管理情况

垣曲县逸景幼儿园建设项目在投入使用后，房屋建筑物未及时转入固定资产进行管理，也未办理房产登记手续。

（五）专项收入归集使用情况

垣曲县逸景幼儿园为一级 A 类园，收入主要为保教费收入和补贴收入，保教费为 245 元/月/人，补助收入为 900 元/年/人，每学期为 5 个月，每名学生 1675 元/学期。该项目的收费模式为学生家长直接缴费至国库，由垣曲县财政局统一管理，2023 年运营后，共招生 69 名，收入为 115,575.00 元，其中：保教费收入 84,525.00 元，补贴收入 31,050.00 元。

（六）项目绩效目标

1. 总体目标

通过完成一栋三层 6550 m²的框架式教学楼建设及装饰等建设，新建 1 所全日制幼儿园，设 6 轨 18 个班，满足 540 名幼儿的学习生活，从而提升教育质量，扩大优质教育资源覆盖面。

2. 运营期目标

（1）产出目标：具备 6 轨 18 个班运营条件，2023 年春季开始首期招生运营。

(2) 效益目标：实现预设经济效益目标，解决幼儿入学难问题，推动垣曲县学前教育发展，满意度 $\geq 90\%$

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的和依据

1. 绩效评价目的

通过项目绩效评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。根据确定的绩效目标，通过采集绩效评价基准日的绩效运行数据，对管理执行的相关情况和目标要求的完成情况进行跟踪，并在归纳分析的基础上，及时、系统的反映绩效目标实现程度和预算执行进度等。本次绩效评价遵循财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）等文件的相关规定，客观、公正、全面地评价项目的立项依据，评价项目组织管理、资金分配与使用情况、效益实现情况等，发现绩效运行偏差，发现问题，总结经验，并提出纠正措施和建议。

2. 绩效评价依据

绩效评价依据包括但不限于：

- (1) 《中华人民共和国预算法》
- (2) 《中华人民共和国预算法实施条例》
- (3) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
- (4) 《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）
- (5) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

(6) 《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》(财预〔2020〕61号)

(7) 《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》(财监〔2021〕4号)

(8) 《山西省财政厅关于印发〈省级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(晋财绩〔2020〕17号)

(9) 《山西省政府专项债券管理暂行办法》(晋政发〔2020〕23号)

(10) 《山西省财政厅关于印发〈政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》(晋财债〔2021〕38号)

(11) 《中国注册会计师协会关于印发〈会计师事务所财政支出绩效评价业务指引〉的通知》(会协〔2016〕10号)

(12) 其他相关文件及规定

(二) 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象是垣曲县逸景幼儿园建设项目,绩效评价范围为该项目的决策、管理、产出、效益。

(三) 绩效评价基准日

本次绩效评价基准日期为2023年5月31日。

(四) 绩效评价原则

1. 独立原则。在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

2. 客观原则。按照协议(合同)约定事项客观公正、实事求是地开展绩效评价,不得出具不实绩效评价报告。

3. 规范原则。履行必要评价程序,合理选取具有代表性的样本,

对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具绩效评价报告。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《山西省财政厅关于印发〈政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（晋财债〔2021〕38号）文件要求，结合该项目的相关规定，按照“决策-管理-产出-效益”的逻辑思路对绩效目标进行分解，结合通用标准、计划标准等制定指标目标值，形成垣曲县逸景幼儿园建设项目绩效评价指标体系。

2. 评价指标设置

本次绩效评价主要从决策、管理、产出、效益四方面进行评价。绩效评价指标共分三级。一级指标四个：决策（20分）、管理（40分）、产出（30分）、效益（10分）；二级指标十五个：决策过程、绩效目标、债券安排、资金管理、资产管理、组织管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度；三级指标三十二个，其中决策类四个、管理类十三个、产出类八个、效益类七个。

（1）决策类指标设置

决策类指标从决策过程、绩效目标、债券安排三方面进行评价，其中决策过程从项目立项规范性、项目支持领域和方向相符性两方面进行评价；绩效目标从绩效目标合理性方面进行评价；债券安排从申请额度与实际需要匹配性方面进行评价。决策类共设置3个二级指标、4个三级指标。

(2) 管理类指标设置

管理类指标从资金管理、资产管理、组织管理三方面进行评价，其中资金管理从债券资金管理核算规范性、债券资金使用合规性、本息缴付及时性、预期收益合理性、偿债保障措施有效性、年度收支偿债匹配性六方面进行评价；资产管理从资产管理规范性方面进行评价；组织管理从运行机制有效性、管理制度健全性、制度执行有效性、信息公开规范性、信息系统管理和使用规范性、问题整改情况六方面进行评价。管理类指标共设置 3 个二级指标、13 个三级指标。

(3) 产出类指标设置

产出类指标主要是从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面进行评价，其中产出数量从运营目标完成率方面进行评价；产出质量从运营质量达标、资产维护质量达标两方面进行评价；产出时效从运营完成及时性方面进行评价；产出成本从运营成本支出合理性、运营成本控制有效性、安全生产（运营率）、投诉处理及时率四方面进行评价。产出共设置 4 个二级指标、8 个三级指标。

(4) 效益类指标设置

效益类指标从经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四方面进行评价，其中经济效益从经济效益实现情况进行评价；社会效益从解决入学难问题、推动学前教育发展两方面进行评价；可持续影响从人才技术支撑、财务状况可持续性、相关政策支持度三个方面进行评价；满意度从社会公众满意度方面进行评价。效益共设置 4 个二级指标、7 个三级指标。

具体评价指标设置、权重、指标解释、评分依据、评分标准见附件 1。

3. 项目分值评级

项目评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

项目分值与等级表

等级	优	良	中	差
分值	≥90	≥80, <90	≥60, <80	<60

(六) 绩效评价方法

1. 成本效益分析法。将项目的投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2. 比较法。将项目实施后已经产生和预期产生的经济效益和社会效益与预先目标进行比对分析。

3. 因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4. 公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对项目进行评判，评价绩效目标实现程度。

(七) 绩效评价标准

1. 计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为绩效评价标准。

2. 行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定的绩效评价标准。

3. 历史标准。参照历史数据制定的绩效评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的绩效评价标准。

4. 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(八) 绩效评价工作过程

1. 绩效评价人员及分工

根据垣曲县逸景幼儿园建设项目绩效评价的业务需要，组建成立项目绩效评价小组。绩效评价工作组成员名单详见下表：

评价小组成员分工

序号	姓名	在本项目中担任职责	技术职称	工作内容
1	陈创存	质量控制复核人	注册会计师、评估师	协调沟通，参与制定实施方案，修改绩效评价报告，督导项目进度和项目质量。
2	阴文平	二级复核人	注册会计师	参与制定实施方案，督促项目组按照时间进度执行业务，参与报告修改，审核报告。
3	周杰	项目负责人	注册会计师	组织制定方案与现场绩效评价、负责总报告撰写。
4	张小兰	绩效评价组成员	助理	参与现场绩效评价、问卷调查等
5	吴亚鹏	绩效评价组成员	助理	参与现场绩效评价、问卷调查等

2. 工作安排、工作要求及具体时间进度安排

绩效评价工作分为评价准备阶段、评价实施阶段和评价报告撰写阶段。

(1) 评价准备阶段

制定绩效评价实施方案。收集并阅读绩效评价相关资料和政策，明确绩效评价的重点方向和相关评价内容；与相关部门接触，获取相关资料，明确项目实施范围、项目金额等方面的内容，根据了解到的实施情况，成立绩效评价讨论小组，讨论本次评价的重点、指标体系的构建、问卷调查的内容及范围，然后制定评价方案并进行撰写，报送垣曲县财政局绩效管理股。评价小组根据专家审核论证意见对方案和指标进行修改并完善，确定绩效评价方案、指标体系、调查问卷及访谈内容。

(2) 评价实施阶段

评价小组根据确定的工作方案，下发基础数据采集表、资料清单等至被评价单位，由项目负责人填写基础数据采集表，准备相关资料。

组织评价小组人员对项目单位提供的资料进行审核，重点对资金申报材料、资金拨付、资金使用等进行复核，并查看相关资料，深入了解项目情况。进行问卷发放，整理项目受益对象的满意程度和看法。

(3) 报告撰写提交阶段

评价小组整理、综合分析项目相关信息，根据评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，提炼结论撰写绩效评价报告，并提交至垣曲县财政局绩效管理股征求意见，根据专家审核意见修改绩效评价报告，提交至垣曲县财政局绩效管理股。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

绩效评价小组通过实施数据采集、现场核查、问卷调查、重点访谈、汇总分析等程序，依据相关文件和经审定的绩效评价指标体系及评分标准，对垣曲县逸景幼儿园建设项目进行客观评价，最终评分结果为 93.50 分，评分等级为“优”，各指标得分情况见附件 2。各项指标分值及得分情况见下表：

绩效评价得分表

指标	决策	管理	产出	效益	合计
分值	20.00	40.00	30.00	10.00	100.00
得分	19.50	35.00	30.00	9.00	93.50
得分率	97.50%	87.50%	100.00%	90.00%	93.50%

(二) 评价结论

经过对垣曲县逸景幼儿园建设项目决策、管理、产出和效益综合评价，得出以下结论：

1. 项目决策。决策过程方面，该项目立项依据充分，符合国家相

关法律法规；项目公共特点明显，符合地方政府债券资金申请标准；绩效目标方面，绩效目标依据充分，能够细化、可衡量；债券安排方面，项目申请债券资金额度能够满足项目建设实际需求。

2. 项目管理。资金管理方面，债券资金收支能够纳入政府性基金管理，使用用途符合规定，能够及时付息，具备按时偿债能力。在资产管理方面，房屋建筑物未能及时转为固定资产管理，未取得产权登记手续。在组织管理方面，项目运行管理机制较为健全，执行有效，信息公开规范及时。

3. 项目产出。项目能够按计划开始运营招生，产出质量经考核后能够达到目标，运营成本支出合理，运营期未发生安全事故。

4. 项目效益。该项目在经济效益方面未能 100%完成经济效益目标，在社会效益方面，通过幼儿园运营，解决了垣曲县南部幼儿入学难问题，推动了垣曲县学前教育的发展，受益群众满意度较高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策情况分别从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行分析，共设置三个二级指标四个三级指标。决策类指标分值 20 分，实际得分 19.5 分，得分率 97.5%。各分项指标得分情况见下表：

决策类指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
A1 决策过程	A1-1 项目立项规范性	4.00	3.50
	A1-2 项目支持领域和方向相符性	4.00	4.00
	小计	8.00	7.50
A2 绩效目标	A2-1 绩效目标合理性	6.00	6.00
	小计	6.00	6.00

二级指标	三级指标	分值	得分
A3 债券安排	A3-1 申请额度与实际需要匹配性	6.00	6.00
	小计	6.00	6.00
决策	合计	20.00	19.50

1. A1 决策过程，分值 8 分，得分 7.5 分

(1) A1-1 项目立项规范性

2020 年 1 月 15 日，垣曲县人民政府第 5 次常务会议提出，根据《国务院办公厅关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》及《山西省人民政府办公厅关于全省开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》文件精神，小区配套幼儿园要与小区同步规划验收，逸景幼儿园项目由垣曲县教科局负责组织实施。

2020 年 3 月 23 日，垣曲县行政审批服务管理局以《垣审管函（2020）67 号》批准垣曲县逸景幼儿园建设项目可行性研究报告；2020 年 10 月 16 日，垣曲县行政审批服务管理局以《垣审管函（2020）197 号》批准垣曲县逸景幼儿园建设项目初步设计。2020 年 11 月取得垣曲县行政审批服务管理局核发的《建设工程规划许可证》（建字第 140827202003023 号），但施工手续不全，建设报建程序不规范。

依据评分标准，项目有明确的政策文件、政府会议纪要及行政审批部门的立项批复，得 3 分；符合行业建设标准得 0.5 分；相应建设报建程序规范得 0.5 分。此处得分 3.5 分。

(2) A1-2 项目支持领域和方向相符性

垣曲县逸景幼儿园建设项目属于 2022 年新增专项债券资金投向领域中社会事业-教育（学前教育和职业教育），符合《山西省发改委 山西省财政厅〈关于申报 2022 年新增专项债券项目和资金需求得通知〉》，属于国家明确的投向领域及允许类清单。

垣曲县逸景幼儿园属于公立幼儿园，由政府出资建设运营，目的是提供广覆盖、保基本、有质量的学前教育服务，使广大儿童能以较低成本获得入园机会，得到有质量的基本公共教育服务；该项目公益特点较为清晰。

垣曲县逸景幼儿园建设项目建设资金使用债券资金及县政府配套资金，项目投入运营后，使用资金均为县级预算资金。符合《国务院办公厅关于印发基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》等事权与支出责任划分规定。

依据评分标准，属于财政部、国家发改委文件明确的投向领域及允许类清单，得2分；项目公益性特点清晰，得1分；符合各级政府事权与支出责任划分规定，得1分。此处得分4分。

2. A2 绩效目标，分值6分，得分6分

(1) A2-1 绩效目标合理性

经查看垣曲县逸景幼儿园绩效目标申报表，该园能够制定绩效目标申报表，设定的目标切合实际，较为合理。依据评分标准，项目实施单位按要求进行绩效目标申报，设定的目标切合实际，体系完整，规范合理、利于衡量，得2分；项目实施单位设定了明确的绩效指标，得2分；实施单位对绩效指标的时间点、计划任务、工作量、工作内容进行了细化和量化，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分。此处得分6分。

3. A3 债券安排，分值6分，得分6分

(1) A3-1 申请额度与实际需要匹配性

垣曲县逸景幼儿园建设项目共申请债券资金1,000.00万元，经查看项目建设相关合同及财务资料，截至绩效评价日，该项目共投资

金额 2.691.27 万元，项目债券资金额度达到了项目实际建设需求的 100%，项目申请债券资金额度及比例能够满足项目实际建设需求，项目债券资金申报额度与实际需求能够匹配。依据评分标准，项目债券资金额度达到项目实际建设需求 100%，得 6 分，此处得分 6 分。

（二）项目管理情况

管理分别从资金管理、资产管理、组织管理三个方面进行分析，共设置三个二级指标十三个三级指标。过程类指标分值 40 分，实际得分 35 分，得分率 87.5%。各分项指标得分情况见下表：

管理类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分
B1 资金管理	B1-1 债券资金管理核算规范性	3.00	3.00
	B1-2 债券资金使用合规性	2.00	2.00
	B1-3 本息缴付及时性	3.00	3.00
	B1-4 预期收益合理性	6.00	4.00
	B1-5 偿债保障措施有效性	3.00	3.00
	B1-6 年度收支偿债匹配性	3.00	3.00
	小计	20.00	18.00
B2 资产管理	B2-1 资产管理规范性	5.00	3.00
	小计	5.00	3.00
B3 组织实施	B3-1 运行机制有效性	4.00	4.00
	B3-2 管理制度健全性	4.00	4.00
	B3-3 制度执行有效性	3.00	3.00
	B3-4 信息公开规范性	2.00	2.00
	B3-5 信息系统管理和使用规范性	1.00	1.00
	B3-6 问题整改情况	1.00	0.00
	小计	15.00	14.00
过程	合计	40.00	35.00

1. B1 资金管理，权重 20 分，得分 18 分

(1) B1-1 债券资金管理核算规范性

经查看垣曲县逸景幼儿园建设项目运营期的专项债券收支凭证、账簿、相关核算账户等资料，该幼儿园为一级 A 类园，主要收入为保教费及补助收入，保教费为 245 元/月/人，补助收入为 900 元/年/人，每学期为 5 个月，每年 10 个月，每名学生共计 1675 元/学期。该项目的收费模式为学生家长直接缴费至国库，由垣曲县财政局统一管理，2023 年运营后，共招生 69 名，收入为 11.56 万元；经查看专项债转贷协议，该项目自 2022 年 6 月 28 日开始计息，每年 6 月 28 日和 12 月 28 日各付息一次，2022 年 12 月 28 日应付息 16.2 万元。该项利息支出已支付。

依据评分标准，专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金管理，得 2 分；收支科目核算、配套融资核算准确，得 1 分。此处得分 3 分。

(2) B1-2 债券资金使用合规性

经查看《专项债券资金管理办法》《可行性研究批复》《项目预算评审意见》《资金平衡方案》及财务账簿等相关资料，该项目申请的债券资金使用用途能够符合相关规定，能够按照批复用途使用。

依据评分标准，项目债券资金使用符合相关专项债券资金使用管理制度规定得 1 分；按照批复的《平衡方案》等批复用途使用，得 1 分。此处得分 2 分。

(3) B1-3 本息缴付及时性

经查看专项债转贷协议，该 1,000.00 万元债券资金自 2022 年 6 月 28 日开始计息，年利率 3.24%，每年 6 月 28 日和 12 月 28 日各付

息一次，第 11、12、13、14、15 年各按 20%偿还本金和利息。截至绩效评价日，应支付金额为至 2022 年 12 月 28 日的利息 16.2 万元，经查看资料，该笔利息已足额支付。

依据评分标准，项目资金按《偿还协议》约定的时间、额度支付利息及归还本金，得 3 分，此处得分 3 分。

(4) B1-4 预期收益合理性

经查看垣曲县逸景幼儿园相关资料，该幼儿园为一级 A 类园，投入运营后主要收入为保教费及补助收入，保教费为 245 元/月/人，补助收入为 900 元/年/人，每学期为 5 个月，每年 10 个月，每名学生共计 1675 元/学期。2023 年首期共招生 69 名，实际收入为 11.56 万元。依据《资金平衡方案》，该项目 2023 年预测保教费及补助收入为 23.77 万元，换算为同期数据应为 11.89 万元。经计算，实际收入达到预测收入的 97.23%。

截至绩效评价日，垣曲县逸景幼儿园首期运营成本为 319,034.79 元，2023 年预测成本为 29.92 万元。换算同期数据应为 14.96 万元。经计算，实际成本为预测成本的 213.26%。

依据评分标准，项目实际收入、成本达到《资金平衡方案》预期收入、成本 100%得 6 分，达到计划的 90%-100%得 4 分，达到计划的 80%-90%得 2 分，低于 80%得 0 分。共得分 4 分。

(5) B1-5 偿债保障措施有效性

经查看相关资料，垣曲县逸景幼儿园建设项目债券资金由垣曲县财政局代为还本付息，首期利息已足额支付。依据评分标准，项目投入运营后，当专项债券还本付息资金来源出现缺口时，按《资金平衡方案》制定的措施进行资金融入，保障措施有效执行得 3 分。此处得

分 3 分。

(6) B1-6 年度收支偿债匹配性

经查看相关资料，该项目首期运营收入为 11.56 万元，每半年应支付利息为 16.2 万元，首期收入不足以偿还利息。该项目由垣曲县财政局代为偿还利息，且后期随着招生人数扩大，不存在偿债风险。依据评分标准，项目收入支出能按照《资金平衡方案》和《资金使用及偿还协议》的约定还本付息得 3 分，此处得分 3 分。

2. B2 资产管理，权重 5 分，得分 3 分

(1) B2-1 资产管理规范性

经查看垣曲县逸景幼儿园资产管理情况，购置的电子设备等均能及时登记入账，能够对资产情况进行及时统计上报，不存在担保情况。但该项目房屋建设完成后，未能及时办理房屋不动产登记手续。依据评分标准，项目资产及时备案、产权登记管理，得 2 分；对资产情况进行及时统计上报，得 1 分；未在融资平台公司等企业融资提供任何形式的担保，得 2 分。此处得分 3 分。

3. B3 组织管理，权重 15 分，得分 14 分

(1) B3-1 运行机制有效性

经查看垣曲县逸景幼儿园相关资料，该园内部管理组织架构较为清晰，园长负责全面工作，教学副园长负责教学、教研、招生工作，政教副园长负责政教、安全、宣传工作，后勤副园长负责后勤、伙食、卫生工作。小一班和小二班分别分配 3 名教师，中班分配 2 名教师，均安排到位，能够满足运营需要。经查看相关会议纪要，单位重大决策均履行三重一大相关程序。

依据评分标准，具备清晰的内部管理组织架构，部门、人员分工

明确，项目运营、维护人员岗位数量等安排到位，能够满足运营需要，得1分；单位重大决策，履行“三重一大”相关程序予以科学决策，得1分；建立健全绩效目标跟踪监控机制，按月进行运行监控并及时上报，得1分；进行年度绩效自评，得1分。此处得分4分。

(2) B3-2 管理制度健全性

经查看垣曲县逸景幼儿园的相关管理制度，该园制定了园务委员会制度、家长委员会制度、工会工作制度、新生入园制度、幼儿接送制度、体弱儿管理制度、晨检及全日观察记录、幼儿生活制度、经费预算管理制度、财产管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理制度、收入管理制度、合同管理制度、财务收支管理制度、园务会议制度、领导值班制度、教师评价制度、幼儿园自评制度、机构设置及人员制度、班主任办理制度、档案管理制度等。各项管理制度较为健全。

依据评分标准，制定健全的业务、财务管理制度，资金管理辦法，是否有明确的议事规则、决策程序和内控管理流程，得2分；制定债券风险防控预案或措施，得2分。此处得分4分。

(3) B3-3 制度执行有效性

经访谈调查，垣曲县逸景幼儿园相关运营管理制度能够有效执行，重大问题决策及大额支出能够履行内部审批程序。政府采购支出如：中央空调系统、净水系统项目，照明设备采购项目，智慧幼儿园采购项目等，均为公开招标采购。因本年度运营尚未结束，该项目运营资料能够按月度及时整理归档。

依据评分标准，项目运营相关管理规定执行到位，重大问题决策、大额支出履行内部审批程序，得1分；属于政府采购的支出进行公开采购，得1分；项目年度运营结束后，项目运营资料齐全并及时归档

管理，得 1 分。此处得分 3 分。

(4) B3-4 信息公开规范性

经调查，垣曲县逸景幼儿园能够在垣曲县人民政府网及时披露债券资金还本付息使用等情况，披露信息完整准确。依据评分标准，此处得分 2 分。

(5) B3-5 信息系统管理和使用规范性

经核实，垣曲县逸景幼儿园项目已进入国家发改委教育建设项目库和财政部地方政府债务管理系统，专项债券项目及资金使用全流程能够及时、准确、完整、规范地录入地方政府债务管理系统等大数据平台。依据评分标准，此处得分 1 分。

(6) B3-6 问题整改情况

经调查访谈，垣曲县逸景幼儿园在外部监督过程中，主要存在消防设施不完善，导致无法验收的问题，目前尚未整改完成。依据评分标准，对于外部审计监督、内部运行监控中发现的问题进行及时整改得 1 分，部分整改得 0.5 分，未及时整改不得分。此处不得分。

(三) 项目产出情况

产出分别从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行分析，共设置四个二级指标八个三级指标。产出类指标分值 30 分，实际得分 30.00 分，得分率 100.00%。各分项指标得分情况见下表：

产出类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分
C1 产出数量	C1-1 运营目标完成率	10.00	10.00
	小计	10.00	10.00
C2 产出质量	C2-1 运营质量达标	3.00	3.00

二级指标	三级指标	权重	得分
	C2-2 资产维护质量达标	2.00	2.00
	小计	5.00	5.00
C3 产出时效	C3-1 运营完成及时性	5.00	5.00
	小计	5.00	5.00
C4 产出成本	C4-1 运营成本支出合理性	3.00	3.00
	C4-2 运营成本控制有效性	3.00	3.00
	C4-3 安全运营率	2.00	2.00
	C4-4 投诉处理及时率	2.00	2.00
	小计	10.00	10.00
产出	合计	30.00	30.00

1. C1 产出数量，权重 10 分，得分 10 分

(1) C1-1 运营目标完成率

依据绩效目标申报表、工作计划等资料，垣曲县逸景幼儿园运营目标为：按 6 轨 18 个班设置，满足 540 名幼儿的学习生活。经查看学生花名册等资料，垣曲县逸景幼儿园于 2023 年 3 月开始运营，具备 18 个班的开办条件，但由于本学期为完整年度的下半学期，因此本期共招生 69 人，通过运营，能够满足幼儿的学习生活所需。依据评分标准，项目投入运营后，能够完成目标计划的，得 10 分，此处得分 10 分。

2. C2 产出质量，权重 5 分，得分 5 分

(1) C2-1 运营质量达标

经查看垣曲县逸景幼儿园绩效考核方案及考核统计表，该园从德育管理、教育教学、考勤、保教质量、廉洁从教等方面按月进行考核，考核结果均为合格，能够达到预期质量目标。依据评分标准，项目提供的服务达到预期质量目标值，得 3 分，此处得分 3 分。

(2) C2-2 资产维护质量达标

经查看垣曲县逸景幼儿园的资产管理台账，能够按照《设施、设备使用及维护制度》，定期组织人员对设施设备进行普查，实行分班定人管护。依据评分标准，项目设施设备等建设或购置的资产维护的质量达到目标得 2 分，此处得分 2 分。

3. C3 产出时效，权重 5 分，得分 5 分

(1) C3-1 运营完成及时性

依据绩效目标申报表设定的目标完成时限，垣曲县逸景幼儿园于 2023 年 3 月按计划开始运营，经查看收入明细，幼儿保教费等收入均按时收缴。依据评分标准，项目投入运营后，按专项债券分年度绩效目标申报表设定的年度经济效益目标计划全部完成 100%，得 10 分；90%（含）以上，得 8 分；80%（含）-90%，得 6 分；70%（含）-80%，得 4 分；60%（含）-70%，得 2 分；低于 60%不得分。此处得分 5 分。

4. C4 产出成本，权重 10 分，得分 10 分

(1) C4-1 运营成本支出合理性

经查看垣曲县逸景幼儿园运营期成本构成情况，运营成本主要为职工工资、办公费、印刷费、水电费等费用，经分析各项成本明细，运营成本构成合理，运营期间未产生与项目无关的其他支出。依据评分标准，项目运营成本构成合理，得 1.5 分；项目运营期间未产生和项目无关的其他支出，得 1.5 分。此处得分 3 分。

费用明细	金额
基本工资	98,020.00
津贴补贴	4,060.00
绩效工资	109,586.00
机关事业单位基本养老保险缴费	27,055.70
职工基本医疗保险缴费	10,991.40

费用明细	金额
其他社会保障缴费	2,040.05
住房公积金	20,291.80
办公费	18,197.80
印刷费	8,500.00
水费	1,700.00
电费	8,102.04
邮电费	1,200.00
物业管理费	2,970.00
培训费	720.00
劳务费	2,600.00
助学金	3,000.00
合计	319,034.79

(2) C4-2 运营成本控制有效性

经调查访谈及查看预算明细等相关资料，垣曲县逸景幼儿园能够按照标准制定预算，符合《资金平衡方案》确定的范围，包括人工薪酬、管理费用、食材油耗，严格执行了成本控制措施。依据评分标准，项目单位进行有效的成本控制，得 1.5 分；成本风险预警以及应对措施落实到位，得 1.5 分，此处得分 3 分。

(3) C4-3 安全运营率

经查看垣曲县逸景幼儿园各项考核结果，安全运营能够达到标准，未发现相关行政问责或经济处罚。依据评分标准，安全运营达到行业标准，且未受到相关行政问责或经济处罚，得 2 分。此处得分 2 分。

(4) C4-4 投诉处理及时率

经调查访谈，垣曲县逸景幼儿园在运营期未接到群众投诉，未出现媒体重大负面舆情报道，未出现对自然生态环境可能造成的负面影响。依据评分标准，此处得分 2 分。

(四) 项目效益情况

效果分别从经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四个方面进行分析，共设置四个二级指标七个三级指标。效果类指标分值 10 分，实际得分 9.00 分，得分率 90%。各分项指标得分情况见下表：

效益类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分
D1 经济效益	D1-1 经济效益实现情况	2.00	1.00
	小计	2.00	1.00
D2 社会效益	D2-1 解决入学难问题	2.00	2.00
	D2-2 推动学前教育发展	2.00	2.00
	小计	4.00	4.00
D3 可持续影响	D3-1 人才技术支撑	0.50	0.50
	D3-2 财务状况可持续性	1.00	1.00
	D3-3 相关政策支持度	0.50	0.50
	小计	2.00	2.00
D4 满意度	D4-1 社会公众满意度	2.00	2.00
	小计	2.00	2.00
效益	合计	10.00	9.00

1. D1 经济效益，权重 2 分，得分 1 分

(1) D1-1 经济效益实现情况

经查看垣曲县逸景幼儿园资金平衡方案等资料，及设置的计划经济效益目标，该项目 2023 年预测保教费和补助收入为 23.77 万元，换算为同期数据应为 11.89 万元。经查看财务资料，本运营期主要收入为保教费及补助收入，保教费为 245 元/月/人，补助收入为 900 元/年/人，每学期为 5 个月，每年 10 个月，每名学生共计 1675 元/学期。2023 年运营后，共招生 69 名，收入为 11.56 万元。达到预期目标的 97.23%，依据评分标准，项目投入运营后，按设定的年度经济

效益目标计划全部完成 100%，得 2 分；低于 100%-80%（含），得 1 分；80%-60%（含），得 0.5 分；低于 60%不得分。此处得分 1 分。

2. D2 社会效益，权重 4 分，得分 4 分

(1) D2-1 解决入学难问题

垣曲县逸景幼儿园的运营，设立 18 个班，可容纳 540 名学前适龄儿童就读，首先解决了逸景小区幼儿入学问题，并可辐射到周边多个居民小区和周边村民儿童，对垣曲县县城南部幼儿入学难问题起到极大缓解。

垣曲县逸景幼儿园为公立幼儿园，经运城市教育局以“分类定级、优质优价”原则评定为一级 A 类幼儿园，具有一流的办园标准、先进的办园理念、高素质的教师团队，经查看教学计划等资料，该园以“以人为本、呵护童心”为办园宗旨，以“立德启智健体育美爱劳”为办园理念，能够将培育和践行社会主义核心价值观融入保育教育全过程，能够为服务区域内的幼儿提供高水平学前教育。

依据评分标准，项目的运营，能够极大改变垣曲县县城南部幼儿入学难问题，得 2 分，此处得分 2 分。

(2) D2-2 推动学前教育发展

垣曲县逸景幼儿园建设项目是垣曲县委县政府、垣曲县教科局从县城幼儿园整体布局考虑而规划建设的，该项目占地 6556.19 m²，为一级 A 类幼儿园，项目的运营，提升了垣曲县公共服务能力，推动了垣曲县学前教育的发展，依据评分标准，此处得分 2 分。

3. D3 可持续影响，权重 2 分，得分 2 分

(1) D3-1 人才技术支撑

经查看垣曲县逸景幼儿园的相关师资配备情况，该园配备的管理

层及教师，均为专业等级较高的人员，具有丰富的教学经验。目前配备园长 1 名，副园长 3 名，教师 8 名，能够保持项目稳定运营。依据评分标准，配备满足项目持续良好运营的人才数量得 0.25 分；提供项目持续良好运营的技术力量得 0.25 分；此处得分 0.5 分。

(2) D3-2 财务状况可持续性

经查看垣曲县逸景幼儿园入园情况及经营情况，该园目前经营良好，债务负担率较低，偿债保障能力较强。依据评分标准，项目单位的经营情况良好，能够满足专项债券项目的持续经营及偿债需求，债务负担率、资产负债率、偿债保障能力、净资产收益率等合理的，得 1 分，此处得分 1 分。

(3) D3-3 相关政策支持度

垣曲县逸景幼儿园为公立幼儿园，属垣曲县教育科技局下属公益二类股级事业单位，具有财政拨款事业编制 10 名，能够确保如期偿还债务。依据评分标准，项目出现风险预警时，有外部政策与之匹配相应支持，能够确保如期偿还债务，得 0.5 分，此处得分 0.5 分。

4. D4 满意度，权重 2 分，得分 2 分

(1) D4-1 社会公众满意度

通过对垣曲县逸景幼儿园学生家长及周边群众进行问卷调查，了解垣曲县逸景幼儿园运营期的满意度评价，根据各方面的满意度打分计算综合满意度，综合满意度为 95.33%。依据评分标准，满意度 $\geq 90\%$ 得 2 分； $60\% \leq \text{满意度} < 90\%$ ，得分 = 满意度 $\times 2$ 分；满意度 $< 60\%$ 不得分。此处得分 2 分。

五、主要经验及做法

垣曲县逸景幼儿园是一所隶属于教育局管辖的小区配套优质公

办幼儿园，旨在解决逸景花城小区及周边小区幼儿入园难问题，是垣曲县委县政府 2020 年重点建设项目。该项目在建设期能够严格执行采购程序，均进行了公开招标采购。

该项目建成运营后，达到一级 A 类标准。可容纳 18 个教学班，解决 540 余名幼儿入园就读问题，确保幼儿享受到优质的学前教育。项目的建成运营解决了儿童的学前教育问题，是周边群众盼望已久的需要，是促进幼儿教育事业持续发展的一大举措，极大改善垣曲县县城南部幼儿入学难的问题。

六、存在的问题及原因分析

（一）未办理施工许可证

经查看垣曲县逸景幼儿园相关建设报建资料，发现该项目未取得施工许可证，建设程序不规范。

（二）资产管理不到位

经查看垣曲县逸景幼儿园账务资料，发现建设工程投入使用后未及时转入固定资产管理，也未办理房产登记手续。

（三）问题整改不到位

经查看垣曲县逸景幼儿园外部检查资料，发现建设项目的消防工程被提出整改意见，截至绩效评价日，未能及时整改。

七、改进建议及措施

（一）完善建设手续，强化资产管理

建议垣曲县逸景幼儿园补充完善施工手续，及时将在建工程转为固定资产，尽快办理房产登记手续。

（二）净化室内环境

经现场查看垣曲县逸景幼儿园教室环境，部分教室家具气味较

重，建议进行室内环境检测，或布置绿植净化空气。

八、绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的重要后续环节，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为此，特提出以下两点建议。

（一）将绩效评价结果反馈告知被评价部门。将评价项目绩效分值、等级，存在的问题及相关建议及时反馈给被评价单位，督促被评价部门对存在的问题及时整改，并对整改结果进行跟踪调查。

（二）在一定范围内通报绩效评价结果。促进和增强被评价单位及社会各界对绩效评价工作重要性的认识，逐步形成社会监督机制，进一步提高财政资金绩效评价结果的影响和社会的理解认同。

附件 1：绩效评价指标体系

附件 2：绩效评价指标评分表

附件 3：反映绩效的照片

附件 4：调查问卷分析报告

山西广和会计师事务所有限公司

2023 年 6 月 8 日

附件 1：绩效评价指标体系

垣曲县逸景幼儿园建设项目政府专项债券资金绩效评价指标体系（决策）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分依据	评分标准
决策 (20分)	决策过程 (8分)	项目立项规范性	4	项目立项依据是否充分；是否符合国家和省相关法律法规和行业宏观政策范围；项目立项程序是否规范。	通用标准	1. 项目有明确的政策文件、政府会议纪要及行政审批部门的立项批复（3分）； 2. 符合相关行业建设标准（0.5分）； 3. 相应建设报建程序规范（0.5分）。
		项目支持领域和方向相符性	4	项目是否符合地方政府债券资金的申请标准，项目公共性特点是否明显，是否符合各级政府事权与支出责任划分规定。	通用标准	1. 是否属于财政部、国家发改委文件明确的投向领域及允许类清单（2分）； 2. 项目公益性特点是否清晰（1分）； 3. 是否符合各级政府事权与支出责任划分规定（1分）。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	6	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	通用标准	1. 项目实施单位按要求进行绩效目标申报，设定的目标切合实际，体系完整，规范合理、利于衡量（2分）； 2. 项目实施单位设定了明确的绩效指标（2分）； 3. 实施单位对绩效指标的时间点、计划任务、工作量、工作内容进行了细化和量化，通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）。

垣曲县逸景幼儿园建设项目政府专项债券资金绩效评价指标体系（决策）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分依据	评分标准
	债券安排 (6分)	申请额度与实际需要匹配性	6	项目申请债券资金额度及比例是否满足项目实际建设需求,用以考核项目债券资金申报额度与实际需求是否匹配合理。	通用标准	项目债券资金额度达到项目实际建设需求 100% (6分), 90%-100% (5分), 80%-90% (4分), 70%-80% (3分), 60%-70% (2分), 60%以下, 得 0 分。

垣曲县逸景幼儿园建设项目政府专项债券资金绩效评价指标体系（管理）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分依据	评分标准
管理 (40分)	资金管理 (20分)	债券资金管理核算规范性	3	评价项目专项债券资金收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理的情况。	通用标准	1. 专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金管理（2分）； 2. 收支科目核算、配套融资核算是否准确（1分）。
		债券资金使用合规性	2	项目债券资金是否按照规定的用途使用资金，用以考核债券资金使用情况。	通用标准	1. 项目债券资金使用是否符合相关专项债券资金使用管理制度规定；（1分） 2. 是否按照批复的《项目平衡方案》等批复用途使用（1分）。
		本息缴付及时性	3	项目专项债是否按《新增专项债券资金使用及偿还协议》约定的时间、额度还本付息，用以考核专项债按计划执行情况。	通用标准	项目资金是否按《新增专项债券资金使用及偿还协议》约定的时间、额度支付利息及归还本金（3分），延迟1次扣1分，延迟2次以上得0分。
		预期收益合理性	6	项目实际收入、成本是否达到《资金平衡方案》计划的收入、成本，用以考核预期收益合理性情况。	通用标准	项目实际收入、成本是否达到《资金平衡方案》预期收入、成本，100%达到6分，达到计划的90%-100%（4分），达到计划的80%-90%（2分），低于80%，得0分。
		偿债保障措施有效性	3	项目收入或获得的其他资金来源，用以考核债券偿还措施的保障情况。	通用标准	项目投入运营后，当专项债券还本付息资金来源出现缺口时，是否按《资金平衡方案》制定的措施进行资金融入，保障措施是否有效执行（3分）。未执行得0分。
		年度收支偿债匹配性	3	项目年度实际收入支出与《资金使用及偿还协议》约定的还本付息是否匹配，用以考核年度收支偿债匹配情况。	通用标准	项目收入支出是否能按照《资金平衡方案》和《资金使用及偿还协议》的约定还本付息（3分），出现债券偿债风险不能正常偿还，得0分。

垣曲县逸景幼儿园建设项目政府专项债券资金绩效评价指标体系（管理）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分依据	评分标准
	资产管理 (5分)	资产管理 规范性	5	项目竣工后资产是否及时备案、是否及时进行产权登记等情况，用以考核项目资产管理情况。		1. 项目资产及时备案、产权登记管理（2分）； 2. 对资产情况进行及时统计上报（1分）； 3. 是否存在对融资平台公司等企业融资提供任何形式的担保（2分）。
	组织管理 (15分)	运行机制 有效性	4	本指标主要考察项目单位是否有健全的运行管理机制，是否满足项目运行需求，用以考核运行机制有效性情况。	通用标准	1. 是否具备清晰的内部管理组织架构，部门、人员分工明确，项目运营、维护人员岗位数量等安排到位，能够满足运营需要（1分）； 2. 单位重大决策，是否履行“三重一大”相关程序予以科学决策（1分）； 3. 是否建立健全绩效目标跟踪监控机制，是否按月进行运行监控并及时上报（1分）； 4. 是否进行年度绩效自评（1分）。
		管理制度 健全性	4	评价项目单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利运营的保障情况。	通用标准	1. 是否制定健全的业务、财务管理制度，资金管理办法，是否有明确的议事规则、决策程序和内控管理流程（2分）； 2. 是否制定债券风险防控预案或措施（2分）。
		制度执行 有效性	3	评价项目运营是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	通用标准	1. 项目运营相关管理规定是否执行到位，重大问题决策、大额支出是否履行内部审批程序（1分）； 2. 属于政府采购的支出是否进行公开采购（1分）； 3. 项目年度运营结束后，项目运营资料是否齐全并及时归档管理（1分）。

垣曲县逸景幼儿园建设项目政府专项债券资金绩效评价指标体系（管理）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分依据	评分标准
		信息公开规范性	2	本指标主要考察项目单位是否及时披露债券资金使用情况、还本付息信息等，用以考察项目信息公开情况。	通用标准	1. 是否及时披露债券资金还本付息使用等情况（1分）； 2. 披露信息是否完整、准确（1分）。
		信息系统管理和使用规范性	1	评价项目在地方政府债务管理系统中录入信息的准确性、完整性和及时性。	通用标准	专项债券项目及资金使用全流程是否及时、准确、完整、规范地录入地方政府债务管理系统等大数据平台（1分）；未及时录入不得分。
		问题整改情况	1	评价项目在内外部监督发现问题后的整改情况。	通用标准	对于外部审计监督、内部运行监控中发现的问题是否进行及时整改（1分）；部分整改（0.5分），未及时整改0分。

垣曲县逸景幼儿园建设项目政府专项债券资金绩效评价指标体系（产出）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分依据	评分标准
产出 (30分)	产出数量 (10分)	运营目标完成率	10	评价项目运营是否实现预期产出数量目标。	计划标准	项目投入运营后,是否按专项债券分年度绩效目标申报表设定的年度产出数量目标计划全部完成 100% (10分); 90% (含) 以上 (8分); 80% (含) -90% (6分); 70% (含) -80% (4分); 60% (含) -70% (2分); 低于 60%不得分。
	产出质量 (5分)	运营质量达标	3	评价项目提供的产品或服务是否达到预期标准。	计划标准	项目提供的公共产品和服务等是否达到预期质量目标值 (3分)
		资产维护质量达标	2	评价项目设施设备建设 (购置) 资产维护的质量达标情况。	计划标准	项目设施设备建设 (购置) 资产维护的质量是否达到目标 (2分)。
	产出时效 (5分)	运营完成及时性	5	评价项目运营是否达到预期时效目标。	计划标准	项目投入运营后,按专项债券分年度绩效目标申报表设定的年度时效目标计划是否全部完成。全部完成 100% (5分); 超过计划时间半年以内 (3分); 超过半年以上不得分,

垣曲县逸景幼儿园建设项目政府专项债券资金绩效评价指标体系（产出）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分依据	评分标准
	产出成本 (10分)	运营成本支出合理性	3	评价项目运营期的成本支出合理性情况。如成本构成的合理性、成本节约率、投入产出比等。	计划标准	1. 项目运营成本构成是否合理（1.5分）； 2. 项目运营期间是否产生和项目无关的其他支出（1.5分）。
		运营成本控制有效性	3	评价项目单位成本控制情况。	计划标准	1. 项目单位是否进行有效的成本控制（1.5分）； 2. 成本风险预警以及应对措施是否落实到位（1.5分）。
		安全生产（运营率）	2	评价项目是否按照行业相关标准和规范进行安全生产（运营）的情况。	计划标准	安全生产（运营）达到是否行业标准，是否受到相关行政问责或经济处罚（2分）
		投诉处理及时率	2	本指标主要考察项目对社会发展、公共服务等方面造成的负面影响。	计划标准	1. 是否接到群众投诉，投诉受理与反馈是否按相关制度及时处理（0.5分）； 2. 是否出现媒体重大负面舆情报道及时控制引导，化解声誉风险（0.5分）； 3. 项目实施对自然生态环境可能造成的负面影响是否控制在预期范围之内（1分）。

垣曲县逸景幼儿园建设项目政府专项债券资金绩效评价指标体系（效益）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分依据	评分标准
效益 (10分)	经济效益 (2分)	经济效益实现情况	2	评价项目运营期是否实现预期经济效益目标。	计划标准	项目投入运营后，按专项债券分年度绩效目标申报表设定的年度经济效益目标计划全部完成100%(2分)；低于100%-80%(含)，得1分；80%-60%(含)，得0.5分；低于60%不得分。
	社会效益 (4分)	解决县城南部入学难问题	2	项目的实施对入学难问题的解决的情况，用以反映项目的社会效益。	计划标准	项目的运营，能够极大改变垣曲县县城南部幼儿入学难问题，得2分，否则不得分。
		推动学前教育发展	2	项目的实施对垣曲县学前教育服务能力的提升情况，用以反映项目的社会效益。	计划标准	项目的运营，能够提升垣曲县公共服务能力，推动垣曲县学前教育发展的，得2分，否则不得分。
	可持续影响 (2分)	人才技术支撑	0.5	评价项目投入运营后持续配备足够数量的人才、技术，用以反映项目的可持续性。	计划标准	1. 是否配备满足项目持续良好运营的人才数量(0.25分)； 2. 是否提供项目持续良好运营的技术力量(0.25分)。
		财务状况可持续性	1	该项指标考察项目单位的运营能力和偿债能力，用于反映项目可持续情况。	计划标准	项目单位的经营情况是否良好，能够满足专项债券项目的持续经营及偿债需求，项目单位债务负担率、资产负债率、偿债保障能力、净资产收益率等是否在合理区间(比例)内(1分)。
		相关政策支持度	0.5	评价项目后续政策支持的可持续性。	计划标准	项目出现风险预警时，是否有外部政策与之匹配相应支持，确保如期偿还债务。(0.5分)
	满意度 (2分)	社会公众满意度	2	评价服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度。	计划标准	满意度 $\geq 90\%$ (2分)； $60\% \leq \text{满意度} < 90\%$ ，得分=满意度 $\times 2$ 分，满意度 $< 60\%$ ，(0分)。

附件 2：绩效评价指标评分表

垣曲县逸景幼儿园建设项目政府专项债券资金绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策 (20分)	决策过程(8分)	项目立项规范性	4.00	3.50	87.50%
		项目支持领域和方向相符性	4.00	4.00	100.00%
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性	6.00	6.00	100.00%
	债券安排(6分)	申请额度与实际需要匹配性	6.00	6.00	100.00%
决策类小计			20.00	19.50	97.50%
管理 (40分)	资金管理(20分)	债券资金管理核算规范性	3.00	3.00	100.00%
		债券资金使用合规性	2.00	2.00	100.00%
		本息缴付及时性	3.00	3.00	100.00%
		预期收益合理性	6.00	4.00	66.67%
		偿债保障措施有效性	3.00	3.00	100.00%
		年度收支偿债匹配性	3.00	3.00	100.00%
	资产管理(5分)	资产管理规范性	5.00	3.00	60.00%
	组织管理(15分)	运行机制有效性	4.00	4.00	100.00%
		管理制度健全性	4.00	4.00	100.00%
		制度执行有效性	3.00	3.00	100.00%
		信息公开规范性	2.00	2.00	100.00%
		信息系统管理和使用规范性	1.00	1.00	100.00%
		问题整改情况	1.00	0.00	0.00%
管理类小计			40.00	35.00	87.50%
产出 (30分)	产出数量(10分)	运营目标完成率	10.00	10.00	100.00%
	产出质量(5分)	运营质量达标	3.00	3.00	100.00%
		资产维护质量达标	2.00	2.00	100.00%
	产出时效(5分)	建设进度完成情况	5.00	5.00	100.00%
	产出成本(10分)	运营成本支出合理性	3.00	3.00	100.00%
		运营成本控制有效性	3.00	3.00	100.00%
		安全运营率	2.00	2.00	100.00%
投诉处理及时率		2.00	2.00	100.00%	
产出类小计			30.00	30.00	100.00%
效益 (10分)	经济效益(2分)	带动招商引资情况	2.00	1.00	50.00%
	社会效益(4分)	解决县城南部入学难问题	2.00	2.00	100.00%
		推动学前教育发展	2.00	2.00	100.00%
	可持续影响(2分)	人才技术支撑	0.50	0.50	100.00%
		财务状况可持续性	1.00	1.00	100.00%
		相关政策支持度	0.50	0.50	100.00%
满意度(2分)	社会公众满意度	2.00	2.00	100.00%	
效益类小计			10.00	9.00	90.00%
合计			100.00	93.50	93.50%

附件 3：反映绩效的照片

反映绩效的照片



教学楼



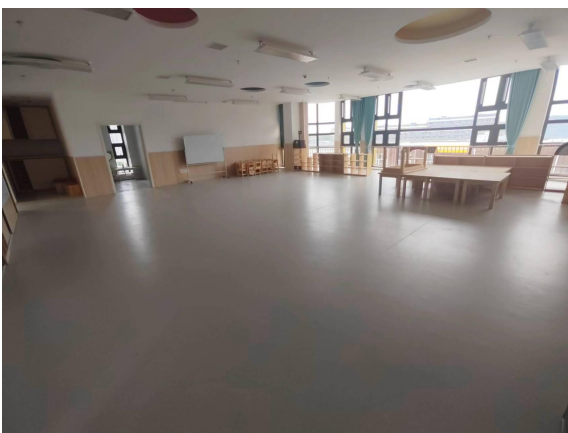
运营照片



南楼



活动场地



教室内景

山西省房屋建筑工程质量责任永久性标牌

项目名称	垣曲县逸景幼儿园建设项目		
竣工日期	2023年2月	设计年限	50年
单位名称	单位法人	项目负责人	其他责任人
垣曲县逸景幼儿园	姜雪慧	裴苏宁	文江艳
山西环中岩土工程勘察有限公司	张金玲	唐磊	秦进生
华诚博远工程技术集团有限公司	周伟	杨海蓉	
山西舜达建筑工程有限公司	曹正民	王宝龙	车江波
山西宇通建设工程项目管理有限公司	黄清霞	张立生	潘清足
垣曲铭昊工程质量检测有限公司	刘昊	张雅娟	

永久标牌

垣曲县逸景幼儿园建设及配套设施建设项目

调查问卷分析报告

一、调查目的

本次调查旨在了解受益对象对垣曲县逸景幼儿园运营期的满意度，为本次绩效评价工作提供数据支撑。

二、调查对象和调查内容

（一）调查对象

本次调查对象为垣曲县逸景幼儿园建设项目受益对象，包括幼儿家长、周边受益群众。

（二）调查内容

主要调查垣曲县逸景幼儿园在运营期的保教质量、安全问题及整体满意度。

三、调查方法与调查方式

（一）调查方法

本次调查采用问卷星方式进行问卷调查，发放 50 份问卷，收回 50 份，均为有效问卷。

（二）问卷的发放和回收

评价小组安排专业调查人员，组织问卷调查工作。在此过程中，将维持良好的问卷作答环境，保证调研的科学性和严谨性。






（三）调研安排

根据项目进度安排，工作组于 2023 年 6 月 1 日—2023 年 6 月 7 日对调查对象开展问卷调查并回收、分析。

四、调查问卷

第 1 题 请您对幼儿园的教学质量进行评价。

本题平均分：4.9






选项	小计	比例
非常不满意	0	 0%
不满意	0	 0%
一般	1	 2%
满意	3	 6%
非常满意	46	 92%
本题有效填写人次	50	

第 2 题 幼儿园在本学期是否发生安全性事件？

选项	小计	比例
是	0	 0%
否	50	 100%
本题有效填写人次	50	

第 3 题 请您对幼儿园的整体运营情况进行评价。

本题平均分：4.86

选项	小计	比例
很不满意	0	 0%
不满意	0	 0%
一般	1	 2%
满意	5	 10%
很满意	44	 88%
本题有效填写人次	50	
